

LĪGUMS JUR 2017-11/864
par ātrumvaļņu izbūvi

AND 15-12-817/119

Ādažu novadā

2017.gada 2.novembrī

Ādažu novada dome (turpmāk – **Pasūtītājs**), ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

SIA “RC Traffic” (turpmāk – **Izpildītājs**), tās valdes priekšsēdētāja Rolanda Stendera-Šteinberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti „Puses” un katra atsevišķi „Puse”, saskaņā ar Ādažu novada domes rīkotā iepirkuma „Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve” (id. Nr. ĀND 2017/113 (turpmāk – Iepirkums)) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2017.gada 24.oktobra sēdes lēmumu par Līguma slēgšanas tiesībām (protokols Nr.05-30-2017/113-4), noslēdz šādu Iepirkuma līgumu (turpmāk – **Līgums**):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU APJOMI

- 1.1. Izpildītājs apņemas veikt **ātrumvaļņu izbūvi (2.lote)** (turpmāk - **Darbi**) saskaņā ar Latvijas Valsts standartiem, „Ceļu specifikācijas 2017”, Tehnisko specifikāciju, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.1), spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma regulējumu un Pasūtītāja norādījumiem.
- 1.2. Darbu izpildes vieta – Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā, Ādažu nov. (turpmāk – **Objekti**) saskaņā ar pielikumā Nr.2 pievienotajām shēmām.
- 1.3. Izpildītājs apliecina, ka parakstot Līgumu, ir iepazinies ar Darbu izpildes apjomu un vietu, un šajā sakarā apņemas pretenzijas necelt.

2. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Kopējā Līguma cena (turpmāk – **līgumcena**) ir **6902,75 EUR** (seši tūkstoši deviņi simti divi euro un 75 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 15 dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.2. Izpildītājs apliecina, ka līgumcenā iekļautas visas Darbu izmaksas, kas saistītas ar Darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līgumu. Līgumcena nevar tikt paaugstināta.
- 2.3. Līgumcenai tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.
- 2.4. Rēķinā Izpildītājs norāda atsauci uz Līgumu (datums, nosaukums un numurs).
- 2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 3.2. Darbu izpildes termiņš – **4 kalendāra nedēļas** no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 3.3. Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstiski par to vienojoties. Ja klimatisko laika apstākļu dēļ Darbus nav iespējams veikt, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt tehnoloģisko pārtraukumu. Pasūtītāja piekrišanas gadījumā Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma laiku.
- 3.4. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kādi noslēdzot Līgumu viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Izpildītājs būtu varējis sagaidīt vai novērst.
- 3.5. Ja Izpildītājs 3.3.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņam par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 nedēļas laikā pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis un mutiski paziņojis Pasūtītājam par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem Darbu izpildes kavējumam, rakstiski jāziņo Pasūtītājam. Pasūtītājam ir pienākums 3 darba dienu laikā sniegt Izpildītājam atbildi uz šādu paziņojumu. Tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas, ja

Saskaņots
Ādažu novada domes
Juridiskās un iepirkuma daļas
juriste
02.11.2017 Natalja Krasnova

1
Ādažu novada domes
galvenā grāmatvede
Anete Vaivade

Izpildītājs pēc minēto apstākļu atklāšanas nekavējoties nav informējis un minētajā termiņā nav nosūtījis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

- 4.1.1. maksāt par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
- 4.1.2. jebkurā laikā ierasties Objektos, kontrolēt Līguma izpildes un Darbu kvalitātes gaitu, pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju kontroles veikšanai, norādot tās sniegšanas veidu un termiņu;
- 4.1.3. veikt kontrolmērījumus, uzmērījumus un/vai laboratoriskās pārbaudes Darbu izpildes kvalitātes pārbaudes gaitā;
- 4.1.4. pieprasīt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa ietvaros izpildīto Darbu, kā arī iebūvēto materiālu atsegšanu, ja Izpildītājs neievēro 4.2.1.apakšpunkta noteikumus un/vai, ja Pasūtītājam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem;
- 4.1.5. brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas varētu traucēt saistību izpildi un radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ;
- 4.1.6. nodrošināt Izpildītāju ar Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
- 4.1.7. pēc nepieciešamības organizēt sanāksmes saistībā ar veiktajiem darbiem Objektos un izpildītiem darbiem, informējot par to Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš.

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

- 4.2.1. veikt Darbus kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Līguma nosacījumiem, izmantojot materiālus, konstrukcijas, izstrādājumus, kas ir norādīti Darbu tāmes piedāvājumā un atbilst Latvijas Republikas standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;
- 4.2.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektos esošo materiālu atbilstību apliecinājošos dokumentus;
- 4.2.3. nodrošināt sertificētu un kvalitatīvu materiālu pielietojumu, apliecinot to ar attiecīgajiem sertifikātiem, ko iesniedz Pasūtītājam pirms materiālu iestrādes Objektos;
- 4.2.4. nodrošināt Darbu veikšanu tādā veidā, lai nepamatoti neapgrūtinātu un neapdraudētu personu pārvietošanos Objektu tuvumā;
- 4.2.5. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai;
- 4.2.6. norīkot un nodrošināt kvalificētu personālu Darbu veikšanai, kā arī piesaistīt Iepirkumā norādīto speciālistu – atbildīgo būvdarbu vadītāju Māri Sauku (LBS BSSI sertifikāts Nr.20-2623 (pielikums Nr.3)), kurš ir kompetents veikt ceļu būvdarbu vadīšanu, ceļu būvuzraudzību un tiltu būvdarbu vadīšanu;
- 4.2.7. uzņemt pilnu materiālo atbildību, t.sk., arī pret trešajām personām, par Darbu veikšanu Objektos, izvietoto iekārtu bojājumiem, zaudējumu vai bojāeju, neatkarīgi no tā, vai konkrētās iekārtas pieder viņam, vai arī tiek nomātas no trešajām personām;
- 4.2.8. patstāvīgi nodrošināt un veikt visu nepieciešamo materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un organizēt tiem nepieciešamās pārbaudes un testus, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu iekārtu, materiālu, piederumu un/vai tehnoloģiju izmantošanu darbu procesā, kas saistīti ar Darbiem;
- 4.2.9. segt pēc 4.1.4.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pieprasījuma veikto visu atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērst konstatētos Līguma pārkāpumus saskaņā ar Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja pēc atsegšanas neatklājas Līguma noteikumu pārkāpumi no Izpildītāja puses, tad Pasūtītājs sedz visas šādas atsegšanas novēršanas izmaksas, kā arī pagarina Darbu izpildes termiņus par to laika periodu, kāds bija nepieciešams, lai veiktu atsegšanu un Darbus no jauna;
- 4.2.10. atbildēt par darba drošības tehniku, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu, kā arī citu normatīvo aktu ievērošanu, izpildot Darbus;
- 4.2.11. nodrošināt Darbu veikšanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, personu manta un netiktu negatīvi ietekmēta vide. Darbu izpildes procesā radītos atkritumus savākt un utilizēt atsevišķi no sadzīves atkritumiem, saskaņā ar normatīvo aktu un vides aizsardzības prasībām;

- inā nav
- Līguma
- s gaitu, dot tās
- izpildes
- ebūvēto vai, ja Darbu
- ildi un
- sūtītāja
- tos un
- vajiem kas ir hnisko
- ilstību
- gajiem
- udētu
- kumā fikāts ceļu
- šanu vai
- un , kā ģiju
- un ma ijas das ika
- arī
- nu ikt es
- 4.2.12. ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem savākt no Objektiem būvgružus vai citus materiālus, kā arī savu inventāru un darba rīkus;
- 4.2.13. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai kaitēt tā interesēm;
- 4.2.14. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt tam informāciju par Darbu izpildes gaitu un apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Darbu izpildi;
- 4.2.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ jau pēc Līguma noslēgšanas un kas varētu traucēt saistību izpildi;
- 4.2.16. atbildēt par apakšuzņēmēju darba kvalitāti un izpildes termiņiem, ja Darbu izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji;
- 4.2.17. līdz Darbu pieņemšanai iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Objektu turpmākai ekspluatācijai;
- 4.2.18. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs saistībā ar veiktajiem darbiem Objektos.
- 4.3. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, kas nepieciešami Darbu veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 4.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē Pušu iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā, rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
- 4.5. Ja Izpildītāja darbības rezultātā tiek sabojāti ceļu segumi, inženierkomunikācijas utt., vai nodarīts cits kaitējums, tad to atjaunošanu veic Izpildītājs, par saviem līdzekļiem, līdz Objektu nodošanai Pasūtītājam.

5. GARANTĪJA

- 5.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības **36 mēnešus** no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
- 5.2. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par konstatētajiem defektiem, kā arī apņemas novērst defektus uz sava rēķina, izņemot 5.10.punktā norādītajos gadījumos.
- 5.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, tas nosūta Izpildītājam paziņojumu uz juridisko adresi un e-pastu, norādot vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš akta sastādīšanai nedrīkst būt mazāks par 3 darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu.
- 5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam.
- 5.5. Ja Pušu starpā rodas strīdi vai domstarpības, Objekta remonta vai atjaunošanas nepieciešamību ir tiesīgs noteikt eksperts, kas iecelts ar Pušu vienošanos.
- 5.6. Ja eksperta slēdziens ir nelabvēlīgs Izpildītājam, tad eksperta izmaksas sedz Izpildītājs, ja nelabvēlīgs Pasūtītājam, tad izmaksas sedz Pasūtītājs. Eksperta slēdziens Pusēm ir saistošs un tām nav tiesību turpmāk izvirzīt vienai pret otru jebkādas pretenzijas sakarā ar to.
- 5.7. 5 darba dienu laikā no eksperta slēdziena saņemšanas vai brīža, kad Puses sastādījušas aktu par garantijas darbu veikšanas nepieciešamību, Izpildītājs apņemas izpildīt garantijas darbus un pabeigt tos 5 darba dienu laikā. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, tad Izpildītājs uzsāk garantijas darbus un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju šāda veida un apjoma darbu izpildei objektīvi nepieciešamo termiņu.
- 5.8. Pēc Objekta remonta vai atjaunošanas beigām Puses sastāda un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu par defektu novēršanu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 5.9. Izpildītājs nosaka jaunas garantijas un veic jaunu garantijas apkalpošanu attiecībā uz visu remontējamo vai atjaunojamo Objektu vai tā daļu, ar nosacījumu, ka kopējais garantijas termiņš darbiem nedrīkst pārsniegt Līguma 5.1.punktā noteikto garantijas termiņu.
- 5.10. Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai trešo personu vainas dēļ (apzināta bojāšana). Uz garantijas darbiem neattiecas defekti, kas radušies fiziskas nolietošānās rezultātā, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi vai neparedzētu

apstākļu (dabas stihiju, u.c.) radīti bojājumi.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt šādus apdrošināšanas līgumus:
- 6.1.1. Izpildītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, pirms Līguma noslēgšanas, pilnā apmērā no līgumcenas (ar PVN) pret iespējamajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Apdrošināšanas polise tiek pievienota Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa;
- 6.1.2. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
- 6.2. Apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā.

7. DARBU IZPILDE UN NODOŠANA-PIENĒMŠANA

- 7.1. Izpildītājs veic nepieciešamus sagatavošanas Darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 7.2. Izpildītājs uz sava rēķina organizē visus nepieciešamos mērījumus un testēšanu, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017”, ko veic kompetenta kvalitātes uzraudzības institūcija. Ja mērījumus un testēšanu pasūta Pasūtītājs, tas apmaksā par to izdevumus.
- 7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes ar Darbiem saistītā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības, sadārdzināt izmaksas vai ietekmēt ātruma kvalitāti, Izpildītājs nekavējoties rakstiski paziņo par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas ir iespējams, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu. Ja Darbu izpilde tiek apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo Darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai ja Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Darbus saskaņā ar Līgumu.
- 7.4. Darbu izpilde jāveic darba dienās no plkst. 08.00 līdz 22.00. Darbu veikšana citā laikā jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
- 7.5. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz Darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līguma nosacījumus. Pēc konstatēta pārkāpuma novēršanas Izpildītājs ir tiesīgs atsākt Darbus, saskaņojot ar Pasūtītāju. Izpildītājam nav tiesību uz Darbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā punktā minētajā gadījumā.
- 7.6. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas veic pārbaudi atbilstoši Līgumā noteikumiem un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai nepieņem Darbus, iesniedzot Izpildītājam pretenziju.
- 7.7. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem tikai tad, kad Puses ir parakstījušas Izpildītāja sagatavotu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 7.8. Ja Izpildītājs ir veicis Darbus nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju, kurā norāda Darbu nepilnības, kā arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Defektu aktu paraksta abas Puses. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu vai neierodas uz tā sastādīšanu, par to tiek izdarīta atzīme defektu aktā un neatkarīgi no tā, tas ir saistošs abām Pusēm. Pasūtītājs izdara atzīmi defektu aktā par termiņu, kādā jānovērš trūkumi un iesniedz to Izpildītājam.
- 7.9. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina. Ja nepilnības netiek novērstas Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata samazināt līgumcenu vai vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa. Līguma pirms termiņa izbeigšanas gadījumā Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību.
- 7.10. Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defektu aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.
- 7.11. Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

7.12. Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.

8. LĪGUMSODS

- 8.1. Ja nepamatoti tiek kavēts Darbu izpildes termiņš, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 0,5 % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumā paredzētos darbus.
- 8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 70,00 EUR apmērā 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpuma konstatēšanas reizi. Pārkāpums tiek noformēts ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pilnvarota persona un tas, kopā ar pretenziju, nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam.
- 8.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, sākot ar pirmo kavējuma dienu līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu.
- 8.4. Līgumsods nevar pārsniegt 10 % no līgumcenas. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā tas tiek ieturēts no 2.1.punktā paredzētā maksājuma.
- 8.5. Līgumsods netiek piemērots, ja Līgumā paredzētās saistības tiek kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

- 9.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 9.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 10 darba dienas iepriekš, ja Izpildītājs savas vainas dēļ kavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu ilgāk par 10 kalendāra dienām vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības, ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi vai ar tiesas lēmumu ir pakļauts maksātnespējas procesam.
- 9.3. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 9.2.punktu, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par faktiski izpildītiem Darbiem, kas atbilst Līguma nosacījumiem un ir tālāk izmantojami, Pušu sastādītā un parakstītā aktā noteiktā apmērā. Veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķinātu līgumsodu, pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda aprēķinu.

10. NEPĀRVARAMA VARA

- 10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
- 10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
- 10.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

11. CITI NOTEIKUMI

- 11.1. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar to nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots, lai ietekmētu Līguma noteikumu tulkošanu.
- 11.2. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, ir ceļu ekspluatācijas inženieris Pēteris Sablins, t. 67996265, e-pasts


peteris.sablins@adazi.lv. Atbildīgajai personai jāpilda pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 107.punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par Izpildītājam pielīgto saistību nepienācīgu izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām.

- 11.3. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses, kas veiks darbības Izpildītāja vārdā, kas saistītas ar Darbu kvalitātes kontroli, pieņemšanu, izpildi un komunikāciju ar Pasūtītāju, kā arī citu ar Darbu veikšanu saistītu jautājumu risināšanu, ir valdes priekšsēdētājs Rolands Stenders-Šteinbergs, tālr. 20221130, e-pasts info@rctraffic.lv.
- 11.4. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei 5 dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.
- 11.5. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Puses 1 mēneša laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.
- 11.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 11.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi:
 - 11.7.1. Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā, uz 5 lp.;
 - 11.7.2. Shēmas, uz 5 lp.;
 - 11.7.3. Sertifikāts, uz 1 lp.;
 - 11.7.4. Darbu pieņemšanas–nodošanas akta paraugs, uz 1 lp.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI:

Ādažu novada dome
reģ. Nr. 90000048472
Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164
Banka: Valsts kase
kods: TREL LV22
Konta Nr.: LV43TREL9802419010000

SIA “RC Traffic”
reģ. Nr. 40103495785
Jur. adrese: Lokomotīves iela 46-62, Rīga, LV-1057
Pasta adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004
Banka: AS Swedbank
Konta Nr.: LV86HABA0551032443126


Izpildītājs Guntis Porietis
2017.gada 2.novembrī


Valdes priekšsēdētājs Rolands Stenders-Šteinbergs
2017.gada 2. novembrī



Tehniskais piedāvājums**Satiksmes organizācijas shēmas Ūbeļu ielā realizācija un ātrumvaļņu izbūve Ādažos****Uzdevums**

1.daļa - I kārtā (realizācija tiks veikta pilnīgi vai daļēji, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - SIA "Vertex projekti" satiksmes organizācijas shēmas Ūbeļu ielā Ādažos realizācija.

2.daļa - II kārtā (realizācija tiks veikta pilnīgi vai daļēji, ja izmaksas atbildīs Ādažu novada domes pieejamiem finanšu līdzekļiem) - izbūvēt asfaltbetona, betona bruģakmens aploces ātrumvaļņus (20km/h, 30km/h) un saliekamos ātrumvaļņus Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā, atbilstoši LVS 99 15.04.2010 un pielikumiem nr.1; nr.2; nr.3, nr.4, nr.5, nr.6

Mērvienība

I kārtai jāuzmēra darba daudzumi Ūbeļu ielā, atbilstoši SIA "Vertex projekti" būvdarbu apjomu sarakstam un piezīmēm.

II kārtai jāuzmēra ātrumvaļņa šķērsriezuma tekošie metri, atbilstoši LVS 99 15.04.2010 A pielikumam;

Darba apraksts

I kārtā - satiksmes organizācijas shēmu Ūbeļu ielā, Ādaži realizē atbilstoši SIA "Vertex projekti" izstrādātai satiksmes organizācijas shēmai "Satiksmes organizācijas plāna izstrāde un saskaņošana Ūbeļu ielai Ādažos". Ātrumvaļņu izvietojumu Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju precizē uz vietas.

II kārtā - ātrumvaļņu izbūve Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā, atbilstoši pielikumiem nr.1; nr.2; nr.3, nr.4, nr.5, nr.6

- Jāveic ceļu seguma sagatavošanas darbi pirms ātrumvaļņa izbūves
- Ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona (AC-11_{surf} granīts), betona bruģakmens vai no demontētajiem saliekamiem ātrumvaļņu elementiem (gumijots materiāls).
- Horizontālā apzīmējuma nr.933 no termoplasta uzklāšana uz asfaltbetona seguma ātrumvaļņa un signālstabiņu nr.917 un nr.918 uzstādīšana, atbilstoši LVS 99 15.04.2010.
- Signālstabiņu nr.917 un nr.918 uzstādīšana pie saliekamiem ātrumvaļņiem, atbilstoši LVS 99 15.04.2010.
- Ātrumvaļņu daudzumu un izvietojumu Izpildītājs kopā ar Pasūtītāju precizē uz vietas.

Materiāli

I kārtā - satiksmes organizācijas shēmas realizācijai Ūbeļu ielā, Ādaži pielieto materiālus, atbilstoši SIA "Vertex projekti" izstrādātai satiksmes organizācijas shēmai "Satiksmes organizācijas plāna izstrāde un saskaņošana Ūbeļu ielai Ādažos"

II kārtā - ātrumvaļņu izbūve Alderu ielā, Upmalas ceļos un Vējupes ielā:

- 1.1. Asfaltbetons AC-11_{surf} granīts priekš asfaltbetona seguma ātrumvaļņiem.
- 1.2. Saliekamie ātrumvaļņi, kas ražoti no gumijota materiāla.
- 1.3. Betona bruģakmens baltais bruģakmens (baltais cements) un melnais bruģakmens prizma (200x100x80)
- 1.4. Ceļa apmales 220X100X15

Iekārtas

- Asfaltbetona termokonteineris ar apsildi, asfaltbetona bliete, asfaltbetona zāģis, spēka zāģis, atskaldāmais āmurs, asfaltbetona saduršuvju aizpildāmā iekārta.
- Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai lietosim tehniku, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir paredzēta horizontālo apzīmējumu krāsošanai, aprīkota ar vadības iekārtu, kas nodrošina iestrādāto materiālu izlietojuma daudzuma automātisku regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa apzīmējuma materiāla izsmidzināšanas sprauslu darbību.

Darba izpilde

- Darbus izpildīsim atbilstoši tehniskajām specifikācijām, Latvijas Valsts standartiem, "Ceļu specifikācijas 2017", ko apstiprināja VAS "Latvijas valsts ceļi" Tehniskā komisija 2016. gada 28.oktobrī. Demontētos saliekamos ātrumvaļņus uzstādīsim atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai.

Prasības izpildītam darbam

- Maksimālā pielaišanas atkāpe ātrumvaļņu konstruktīvajiem elementiem ir 5%.
- Izpildīto darbu garantija 3 (trīs) gadi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Ja izbūvētais ātrumvalnis neatbilst LVS 99 15.04.2010 izvirzītajām prasībām un darbi nav veikti atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017", ko apstiprināja VAS "Latvijas valsts ceļi" Tehniskā komisija 2016. gada 28.oktobrī, tad Izpildītājs pārbūvē ātrumvalni pilnā apmērā par saviem līdzekļiem.
- Ja ceļazīmju izbūve neatbilst LVS 77-1 Ceļa zīmes 2016 un LVS 77-2 Ceļa zīmes uzstādīšanas noteikumi 2016, tad Izpildītājs pārbūvē ceļazīmes pilnā apmērā par saviem līdzekļiem.
- Ja uzklātie horizontālie apzīmējumi neatbilst LVS 85 Ceļa apzīmējumi 2016 tad Izpildītājs pārbūvē horizontālos apzīmējumus pilnā apmērā par saviem līdzekļiem.

Rīgā, 2017.gada 09.oktobrī

SIA "RC Traffic"

Valdes priekšsēdētājs



Rolands Stenders-Šteinbergs



Pretendenta rīcībā esošās tehnikas un iekārtu saraksts

Piedāvātās tehnikas nosaukums, izlaiduma gads	Tehniku raksturojošie lielumi – dzinēja jauda, darba platums, celtpēja, tilpums un tml.	Tehniskais stāvoklis	Piederība (īpašumā, jānomā)
Vibroblīte BOMAG BVP 10/36, 2013.g.	Svars 90kg, darba platums 50cm	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Kompresors saspiesta gaisa ražošanai Atlas Copco XAS67DD ar atskaldāmo āmuri, 2007.g.	Darba gaisa spiediens 7 bar.	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Asfaltbetona masas transportēšanas termokonteineris ATC-75 uz a/maš. SCANIA P94, 2000.g.	Termokonteinera ietilpība 8tn.	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Asfaltbetona masas transportēšanas termokonteineris Phoenix uz a/maš. IVECO 260E27, 2000.g.	Termokonteinera ietilpība 14tn. A/maš. - pilna masa 26000kg, mot.tilp.***cm ³ , jauda ***kW	Labā tehniskā stāvoklī	nomā
Auto pašizgāzējs Mercedes Benz 814, 1995.g.	Pilna masa 7490kg, jauda 97kW	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Vibroplātne AMMAN AUP3020, 2010.g.	Svars 90kg, darba platums 60cm	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Asf/betona zāģis HUSQVARNA FS400LV, 2013.g.	Benzīns, zāģdiska diam.450mm	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Betona spēka zāģis STIHL TS800, 2012.g.	Benzīns, diska diam.400mm	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Šuvju apstrādes iekārta RCT/12/10x20, 2013.g.	Termotilpne 12 litri	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Universālais iekrāvējs CASE SV300, 2016.g.	jauda 91.1ZS, pilna masa 4900kg, krauš.h=3.3m, celtpēja 1360kg, frēze 600mm, 0-17cm	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
Traktorbirste BOBCAT S185,68 Augle Broom	Seguma attīrīšanai	Labā tehniskā stāvoklī	īpašumā
BORUM BMT 250, 2006.g.	Speciālā pašgājējtehnika krāsas mehānizētai uzklāšanai	Labā tehniskā stāvoklī	nomā

Hoffman H-16, 2003.g.	Speciālā pašgājējtehnika plastikāta mehānizētai uzklāšanai	Labā tehniskā stāvoklī	nomā
GMAX 3900, 2008.g.	Palīgaprīk. krāsas (šķērsapzīmējumu) uzklāšanai ar roku darbu	Labā tehniskā stāvoklī	nomā
Demarkators CHA TLR-7A, 2007.g.	Krāsas un termoplasta apzīmējumu dzēšanai	Labā tehniskā stāvoklī	nomā

Rīgā, 2017.gada 09.oktobrī

SIA „RC Traffic”
valdes priekšsēdētājs

 Rolands Stenders-Šteinbergs



TĀME
Iepirkuma 2.daļa
"Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve"
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pastāvītājs: Ādažu novada dome
 Objekta nosaukums: "Satiksmes organizācijas shēmas realizācija un ātrumvaļņu izbūve"
 Objekta adrese: Ādažu novads
 Pastāvītājums Nr. ĀND 2017/113

Nr.p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības cena (bez PVN), EUR	Kopā (EUR)
1	Demontētā saliekamā ātrumvaļņa 20km/h (Ubeļu ielā) un jaunu signālstabiņu nr.917 (2 gab.), nr.918 (2 gab.) izbūve Alderu ielā (brauktuves platums 5,0m). Izvietojums pielikums nr.2, nr.3, nr.4	kompl.	3	1330,35	3 991,05
2	Jaunu ātrumvaļņa izbūve no asfaltbetona (AC-11 surf granīts) 20km/h ieskaitot horizontālā apzīmējuma nr.933 no termoplasta uzklāšanu uz ātrumvaļņa un signālstabiņu nr.917, nr.918 uzstādīšanu Vējupes ielā (brauktuves platums 4,8 m). Izvietojums pielikums nr.5.	kompl.	1	1190,70	1 190,70
3	Ātrumvaļņa 20km/h izbūve no baltā betona bruģakmens (baltais cements) prizma 200x100x80 uz 4cm skalotās siksķembas fr.2-5mm uz hvid=20cm biezas dolomīta šķembu maisījuma fr.0-45 pamatnes un gultnes izbūvēšana ieskaitot horizontālā apzīmējuma no melnā betona bruģakmens prizma 200x100x80 un signālstabiņu nr.917, nr.918 uzstādīšana Upmalas ceļi (brauktuves platums 6m). Ceļu apmaļu uzstādīšana 22X100X15 20 t.m. uz betona C30/37. Izvietojums pielikums nr.6.	kompl.	1	1721,00	1 721,00
				Kopā, euro (bez PVN):	6 902,75
				PVN 21%, euro:	1449,58
				KOPĀ ar PVN, euro:	8 352,33

Sastādīja:

Andrejs Strelcovs
 (vārds un uzvārds, paraksts)
 Sertifikāts Nr: 63
 2017.gada 09.oktobris





Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām:


valdes priekšsēdētājs, Rolands Stenders-Šteinbergs
 (amats, vārds un uzvārds, paraksts)






2017.gada 09.oktobris

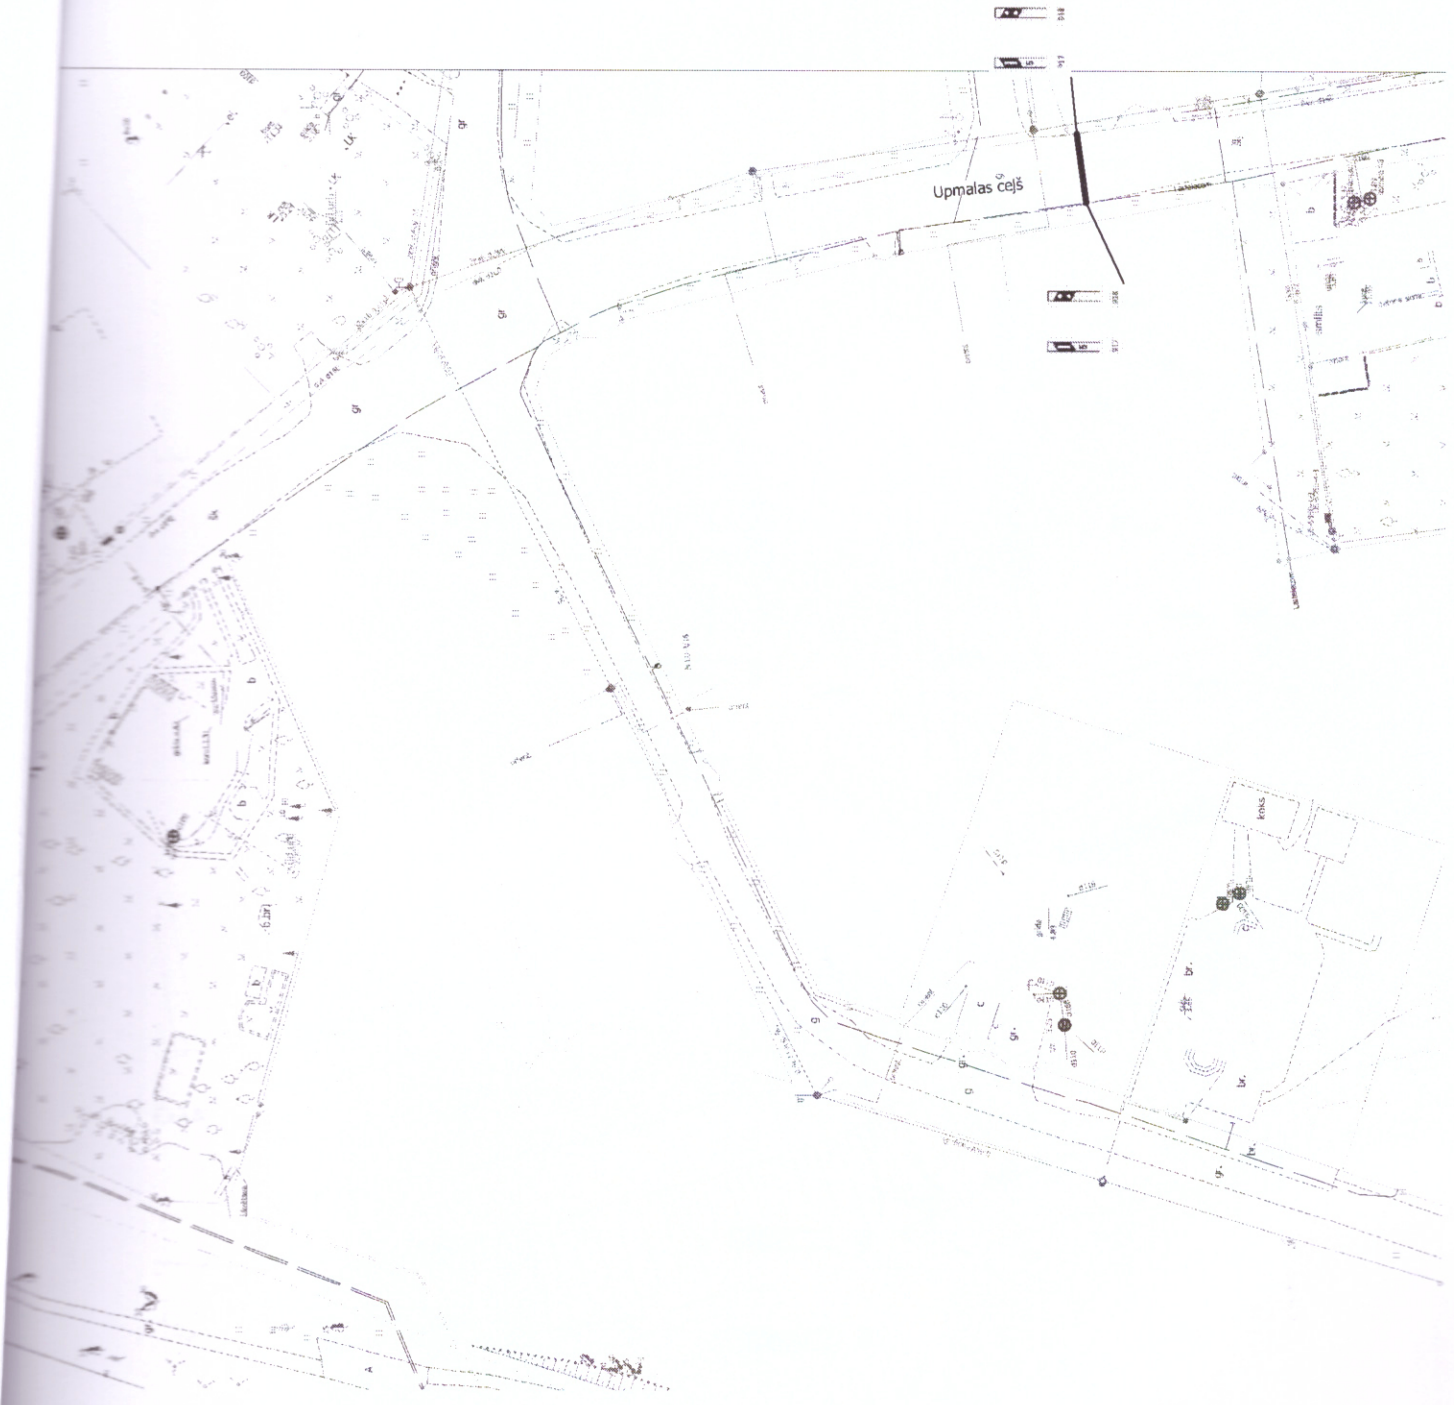


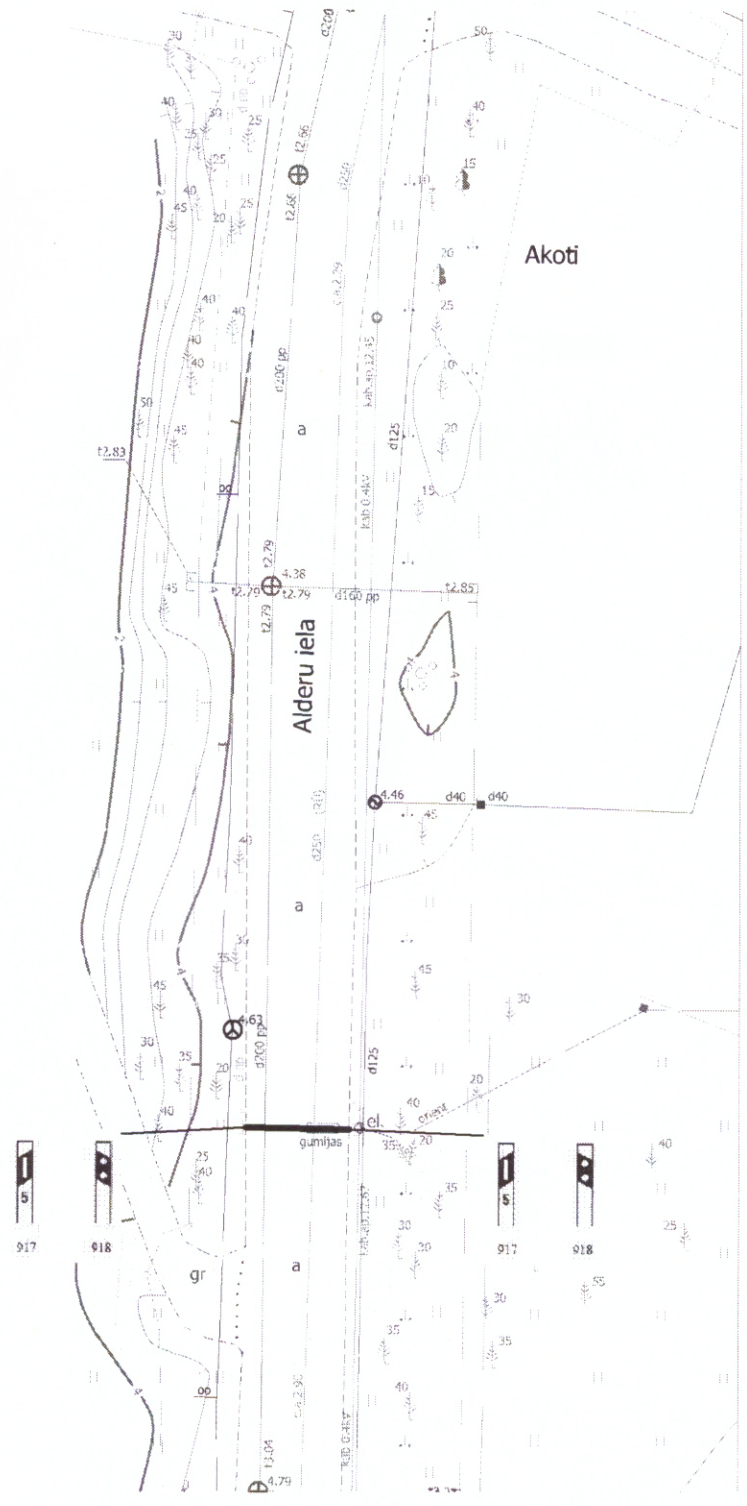

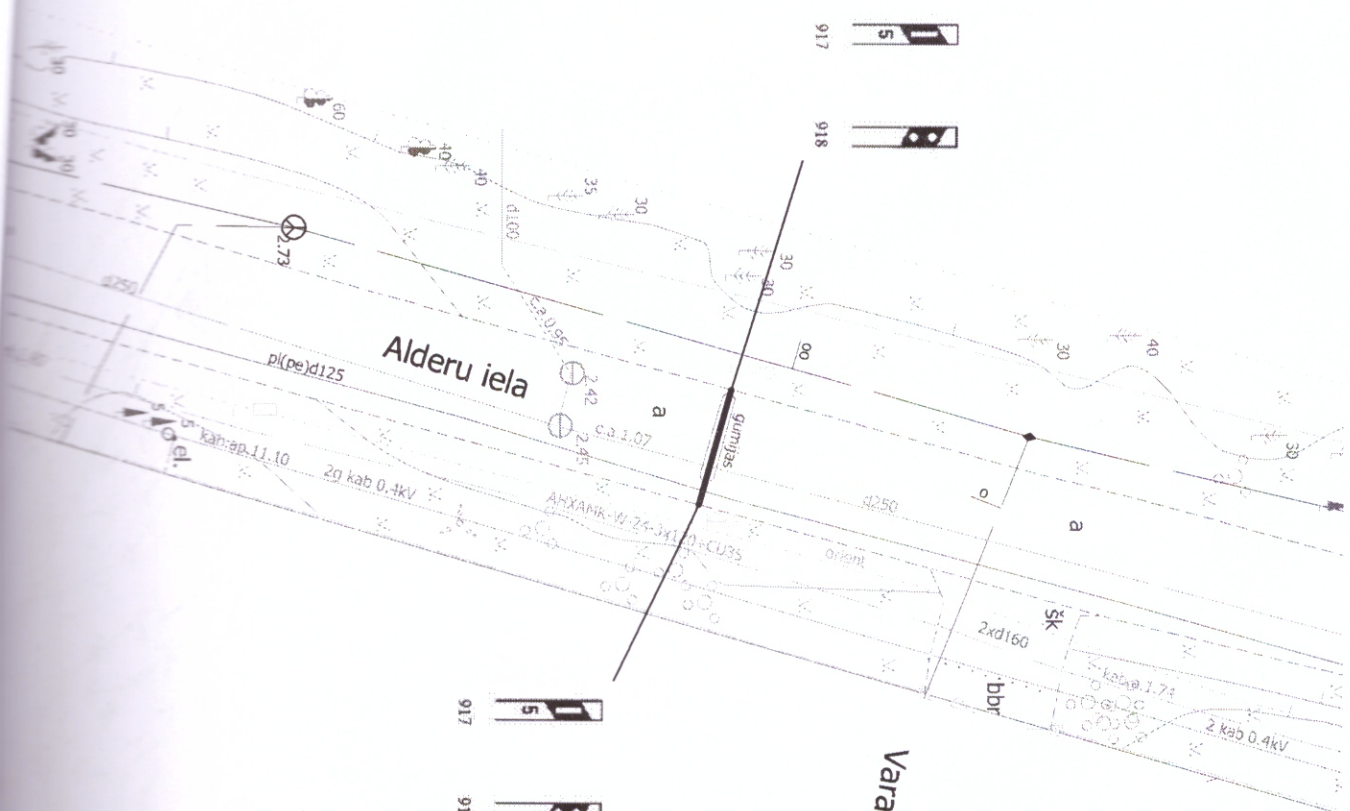

Varavīksnes



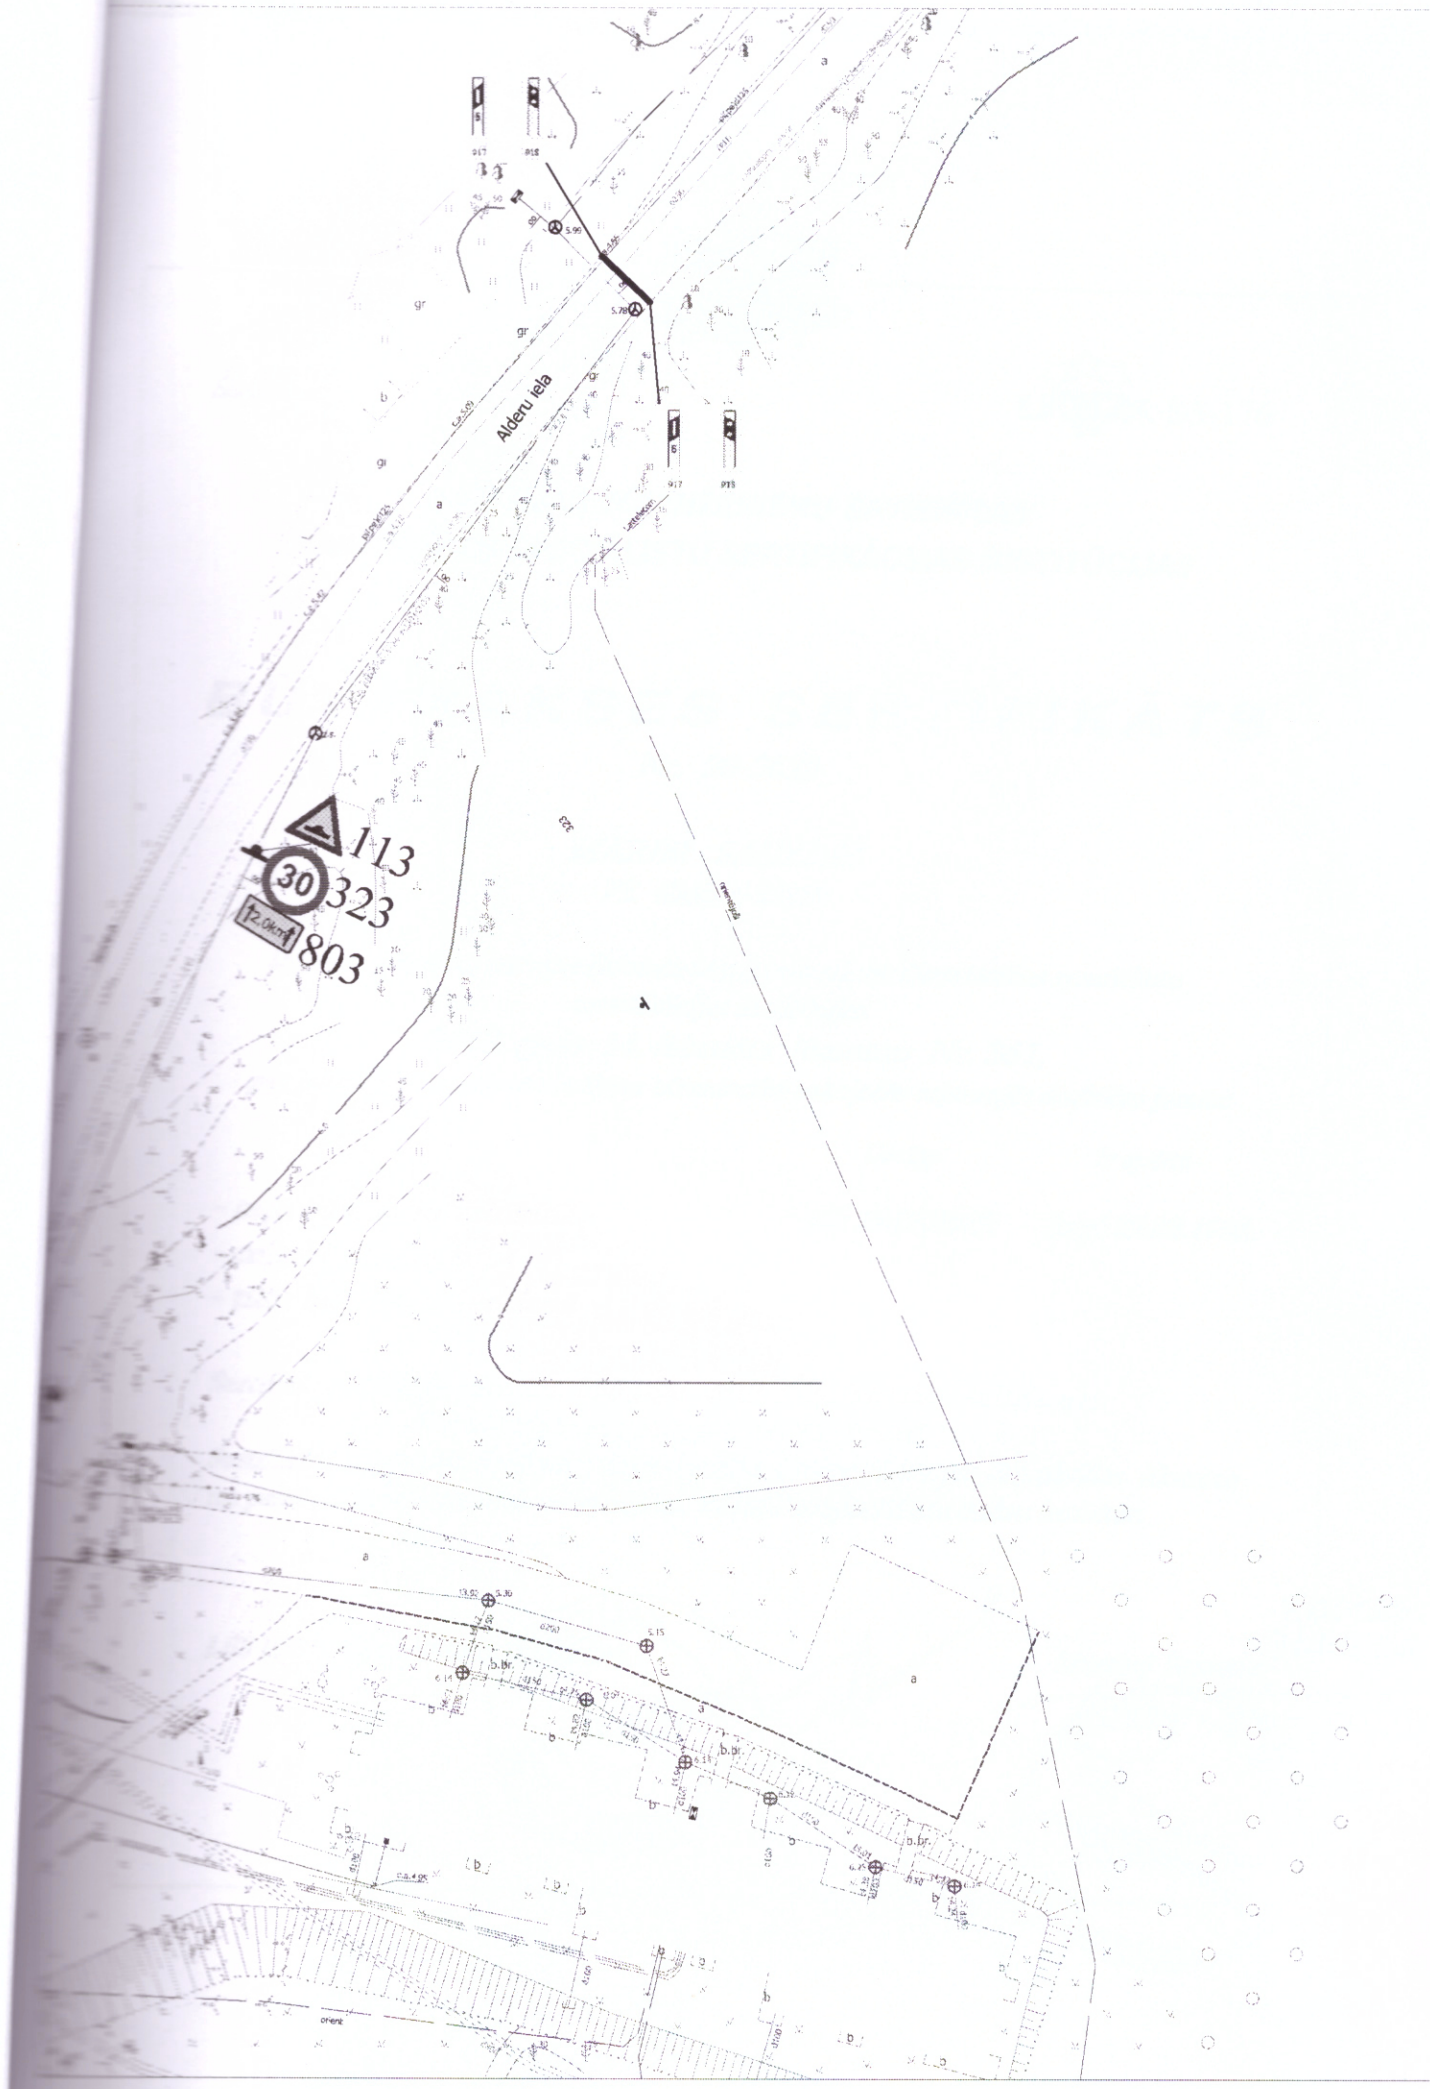

113
30
323
803

Alderi iela

5.99

5.78

5.30

5.15

6.1

6.495

b.fir.

b.fir.

b.fir.

b.fir.


b.fir.

b.fir.

b.fir.

b.fir.

orens



LBS

LAIJK-S3-176

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS
BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU SERTIFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

Nr. 20-2623

MĀRIM SAUKAM
PK 050354-11858

Izdots saskaņā ar Latvijas Būvinženeru savienības Būvniecības speciālistu
sertifikācijas institūcijas
2013. gada 14. februāra lēmumu Nr. 361,
par patstāvīgās prakses tiesībām būvniecībā sekojošās atļautajās darbības jomās:

- | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | <i>Derīgs</i> | <i>Ir spēkā</i> |
| - ceļu būvdarbu vadīšanā | līdz 14.02.2018. | kopš 25.02.1998. |
| - ceļu būvuzraudzībā | | |
| - tiltu būvdarbu vadīšanā | | |

Sertifikāts izsniegts atbilstoši LBS BSSI 2010.g. 10. februāra Nolikumam
„Par būvniecības speciālistu sertificēšanu”.

Sertifikāta saņēmējs apņēmis savā darbībā ievērot Latvijas Republikas likumus
un pastāvošos būvniecības normatīvus, kā arī Būvspeciālistu ētikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais administrators



[Handwritten signature]

Mārtiņš Straume
Rolands Stenders-Šteinbergs
priekšsēdētājs

KOPIJA
PAREIZA



10.2.2017.
[Handwritten signature]

PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS AKTS

Ādažos, 201__gada __. __.

IZPILDĪTĀJS, _____, reģ. Nr. _____, ko pārstāv _____ (nosaukums) _____ nodod un _____ (vārds, uzvārds, amats)

ĀDAŽU NOVADA DOME (Pasūtītājs), reģ. Nr.90000048472, ko pārstāv _____ (vārds, uzvārds, amats)

pieņem saskaņā ar _____.201__ Līgumu Nr. JUR _____ (turpmāk tekstā – Līgums), izpildītos darbus / pakalpojumus (*nevajadzīgo svītrot*).

Akts sastādīts par to, ka Līgumā noteiktie darbi _____ (norādīt Līguma priekšmeta aprakstu tā, kā noteikts Līgumā)

ir izpildīti / pakalpojums sniegts (*nevajadzīgo svītrot*), šādā apjomā:

LĪGUMĀ NOTEIKTĀS PRASĪBAS	Netika prasīts	JĀ	NĒ
Darbu izpildes pārbaude tika veikta klātesot Izpildītāja pārstāvim			
Līgums izpildīts termiņā*			
Pakalpojums sniegts Līgumā noteiktajā adresē			
Darbi izpildīti atbilstoši Izpildītāja noteiktajām kvalitātes prasībām			
Darba veikšanas vieta pēc Darba pabeigšanas ir sakārtotā stāvoklī			
Darbi tika uzsākti Līgumā noteiktajā termiņā			
Līgumā noteiktie dokumenti (darbu izpildes plāni, laika grafiki, u.c.) tika iesniegti			
Izpildītājs uzrādīja izmantoto materiālu sertifikātus un citus kvalitātes dokumentus			
Izpildītājs nodrošināja būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu			
Izpildītājs nodrošināja būvdarbu vadītāja klātbūtni objektā			
Izpildītājs piedalījās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs			
Izpildītājs sniedza kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju termiņā			
Izpildītājs pildīja Pasūtītāja dotos norādījumus			

*Ja ir bijis Darbu izpildes termiņa kavējums, kavēto dienu skaits _____.

Pieņemto Darbu / Pakalpojumu (*nevajadzīgo svītrot*) kopējā summa ir _____ EUR (*summa vārdiem*) bez PVN, PVN ____ % ir _____ EUR (*summa vārdiem*), un kopējā līgumsumma ir _____ EUR (*summa vārdiem*).

Šis akts satur pilnīgu un abusēju vienošanos, par to, ka akta sastādītāji to ir izlasījuši, piekrīt tam un apliecina to ar savu parakstu.

IZPILDĪTĀJS: _____ / V.Uzvārds

ĀDAŽU NOVADA DOME: _____ / V.Uzvārds
